



Ministerul Finanțelor Publice

Raport

privind analiza portofoliului existent de proiecte de investiții publice
ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat
în perioada 01.01. – 31.12.2015


Potrivit programului de investiții publice aprobat ca anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat prin Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, fondurile alocate în anul 2015 pentru cheltuielile de investiții au fost în sumă de 16.927 milioane lei pe total surse de finanțare, din care suma de 14.318 milioane lei de la bugetul de stat.

Pe parcursul anului 2015, pentru proiectele / categoriile de investiții publice au fost efectuate plăți în sumă de 12.983 milioane lei pe total surse (reprezentând 76,6% din programul anual), din care 11.396 milioane lei de la bugetul de stat (reprezentând 79,5% din programul anual).

Prezentăm în tabelul de mai jos situația cheltuielilor de investiții finanțate de la bugetul de stat, detaliată pe titluri de cheltuieli.

milioane lei

Titlul	Plăți la 31.12.2015
TOTAL BUGET DE STAT	11.396
Titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”	511
Titlul 55 „Alte transferuri”(inclusiv alineatul 55.01.12 – „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”)	885
Titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”	5.924
Titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”	0
Titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”	668
Titlul 71 „Active nefinanciare”	3.408

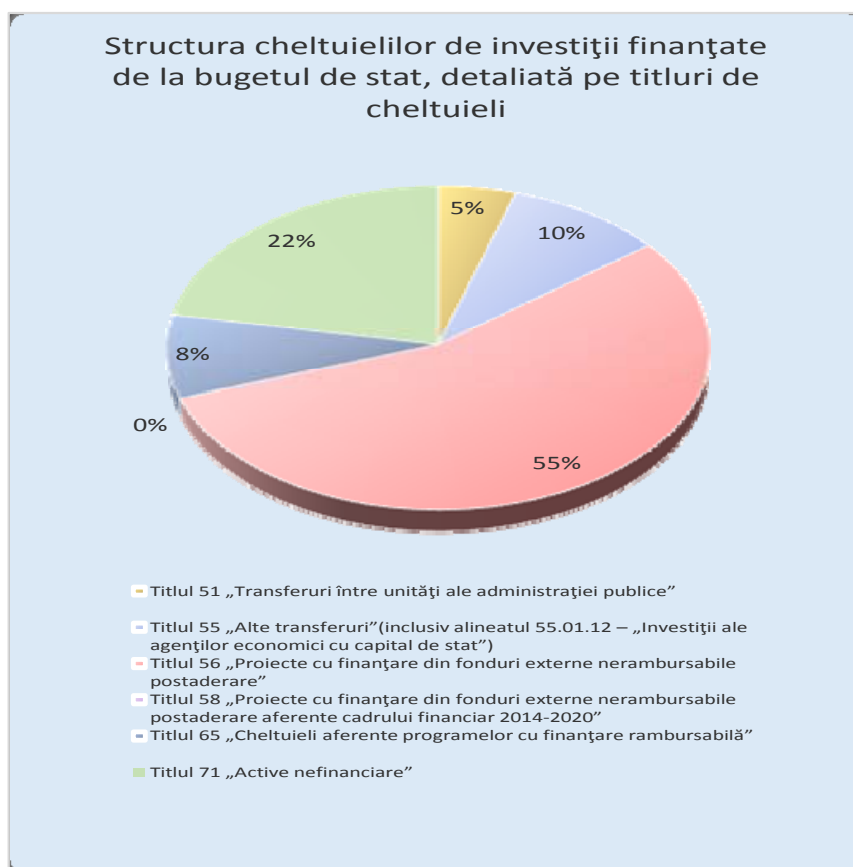

Analizând în structură modul de alocare a fondurilor incluse în programul de investiții publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat prezentat în tabelul de mai jos, se constată faptul că în anul 2015 cea mai mare parte a fondurilor alocate investițiilor publice de ordonatorii principali a fost orientată spre finanțarea și finalizarea obiectivelor de investiții în continuare și noi, cu efect multiplicator și aport direct la formarea brută de capital fix (peste 50,2% din cheltuielile de investiții pe total surse, respectiv peste 57,3% din cheltuielile de investiții alocate din bugetul de stat) și mai puțin către poziția „Alte cheltuieli de investiții” (fondurile prevăzute la această categorie sunt destinate cu preponderență proiectelor de consolidări și intervenții pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale, dotarea cu tehnică specială a unităților din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cât și pentru dotarea instituțiilor publice cu mobilier, calculatoare, aparatură birotică, autoturisme pentru parcul comun și pentru activitățile specifice, etc.).

De asemenea, se remarcă faptul că cea mai mare parte a fondurilor alocate din bugetul de stat a fost direcționată către titlul 56 respectiv pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (50% din totalul fondurilor alocate de la bugetul de stat). Acest fapt relevă o schimbare de optică în modul de prioritizare a proiectelor finanțate comparativ cu perioadele anterior analizate, și anume faptul că actualmente prioritate la finanțare au proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și mai puțin proiectele finanțate exclusiv din surse naționale.

În programele de investiții publice aprobate ca anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pe anul 2015, au fost incluse 368 obiective / proiecte / programe de investiții, din care 341 sunt obiective de investiții în continuare (92,7% din numărul total de obiective) și 27 sunt obiective de investiții noi (7,3% din numărul total de obiective). De remarcat faptul că, din cele 368 obiective, în anul 2015 au avut alocată finanțare doar 292 de proiecte, din care 265 obiective de investiții în continuare și 27 obiective de investiții noi.

Efortul financiar total estimat a fi necesar pentru finalizarea celor 368 obiective / proiecte / programe de investiții noi și în continuare (inclusiv a celor ce se finalizează după anul 2016) este de 75.395 mii lei (63,8% din total cheltuieli de investiții), din care 69.517 mii lei de la bugetul de stat (64,7% din total cheltuieli de investiții de la bugetul de stat).

Structura programului de investiții publice ce rezultă din centralizarea fișelor de investiții aprobate pe anul în curs ca anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat (Anexele nr.28 și 29) este prezentată în tabelul de mai jos.

Structura programului de investiții publice

aprobat pe anul în curs ca anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat

milioane lei


	Număr obiective noi și în continuare*)	2015				Estimări								Total rest de executat 2016 – anii ulteriori	
		Program		Plăți 31.12.2015		2016		2017		2018		Anii ulteriori			
		Total	din care: BS	Total	din care: BS	Total	din care: BS	Total	din care: BS	Total	din care: BS	Total	din care: BS	Total	din care: BS
TOTAL, din care:		16.927	14.318	12.983	11.396	17.510	15.153	11.856	9.691	7.517	5.428	81.312	77.113	118.195	107.385
A – Obiective de investiții în continuare	341	8.081	7.933	5.992	5.949	10.828	10.172	6.188	5.553	3.444	2.870	49.594	45.786	70.054	64.381
% din total	92,7	47,7	55,4	46,2	52,2	61,8	67,1	52,2	57,3	45,8	52,9	61,0	59,4	59,3	60,0
B – Obiective de investiții noi	27	411	271	249	157	631	477	517	466	236	236	3.957	3.957	5.341	5.136
% din total	7,3	2,4	1,9	1,9	1,4	3,6	3,1	4,4	4,8	3,1	4,3	4,9	5,1	4,5	4,8
TOTAL: A + B	368	8.492	8.204	6.241	6.106	11.459	10.649	6.705	6.019	3.680	3.106	53.551	49.743	75.395	69.517
% din total	100,0	50,2	57,3	48,1	53,6	65,4	70,3	56,6	62,1	49,0	57,2	65,9	64,5	63,8	64,7
C – Alte cheltuieli de investiții		8.435	6.114	6.742	5.290	6.051	4.504	5.151	3.672	3.837	2.322	27.761	27.370	42.800	37.868
% din total		49,8	42,7	51,9	46,4	34,6	29,7	43,4	37,9	51,0	42,8	34,1	35,5	36,2	35,3

Notă: *) Acesta reprezintă numărul obiectivelor de investiții noi și în continuare care pot fi identificate distinct. De menționat că, în baza Legii nr. 157/ 2007, ordonatorii principali de credite din cadrul sectorului special (apărare, ordine publică și siguranță națională) nu prezintă fișe distincte pentru obiectivele de investiții sau nu completează fișele de investiții cu date caracteristice sau de identificare a proiectelor respective, aceste informații fiind clasificate de către ordonatorii principali respectivi.


BS = Bugetul de Stat

Programul actualizat la 31.12.2015


Programul pentru anul in curs si estimarile pentru anii ulterioari

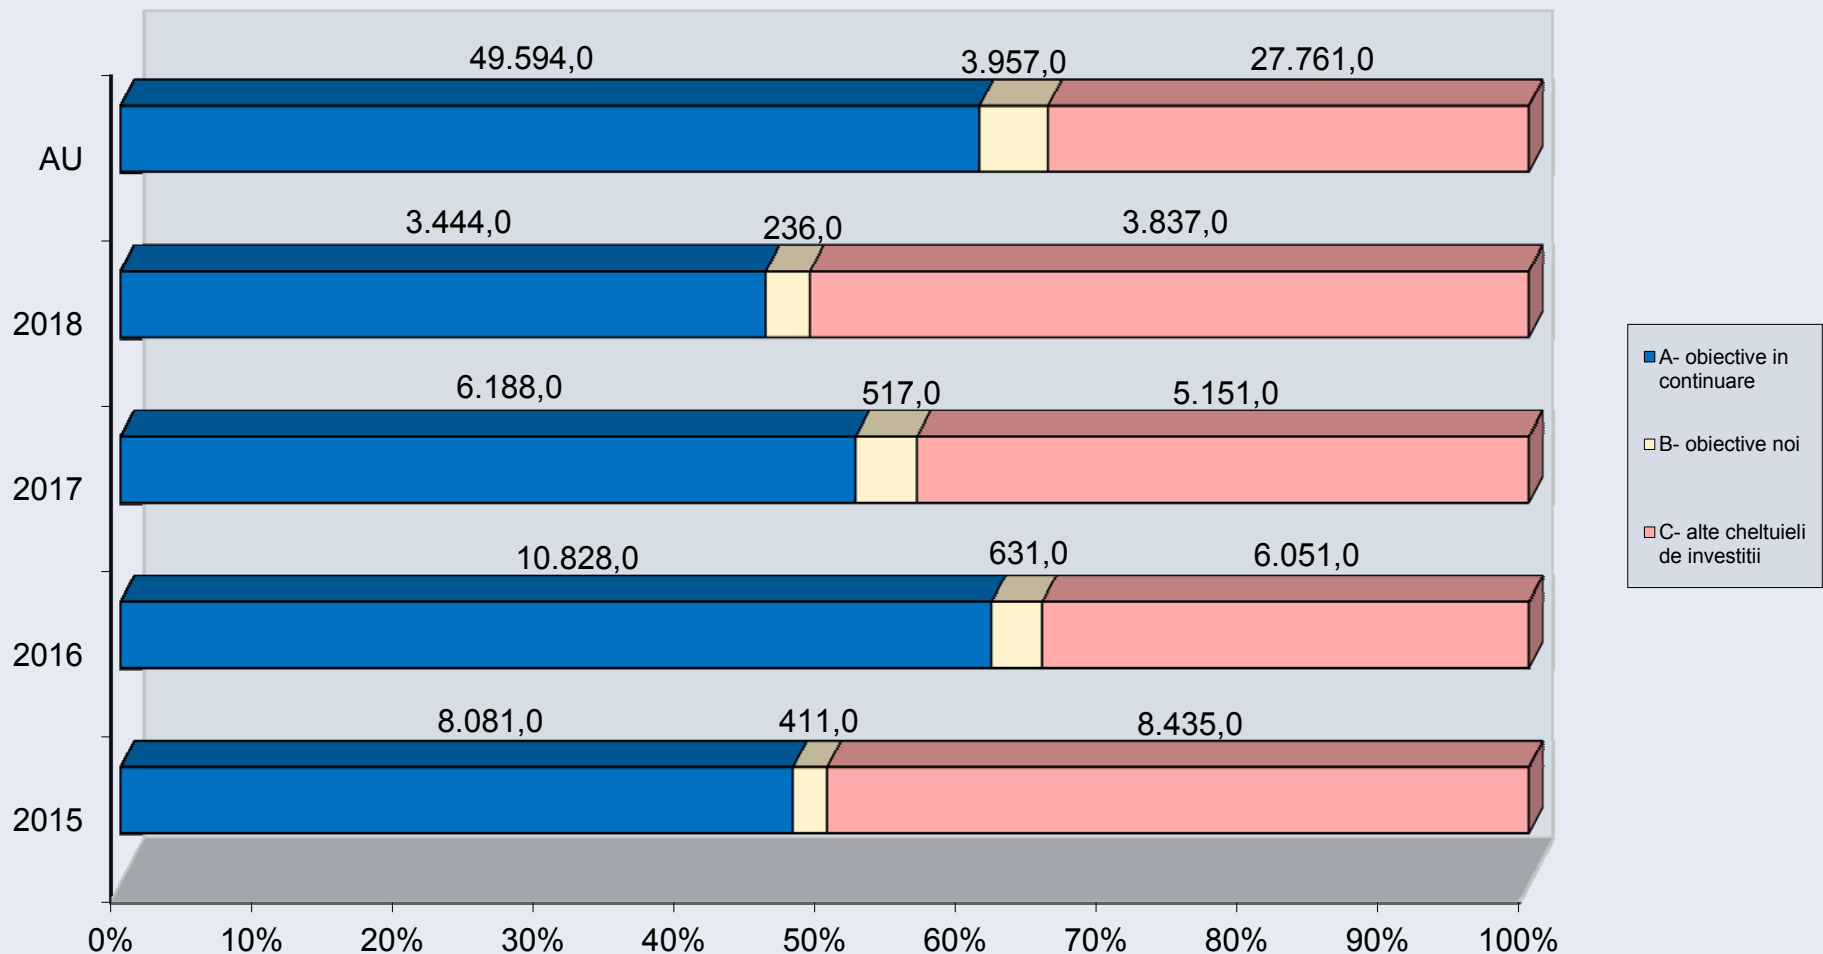

Program actualizat la 31.12.2015, pe total surse -milioane lei-

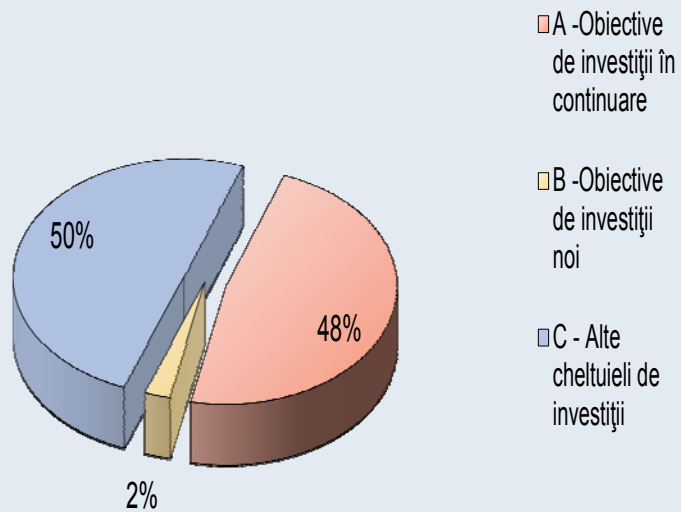

Plăți efectuate în anul 2015, pe total surse -milioane lei-

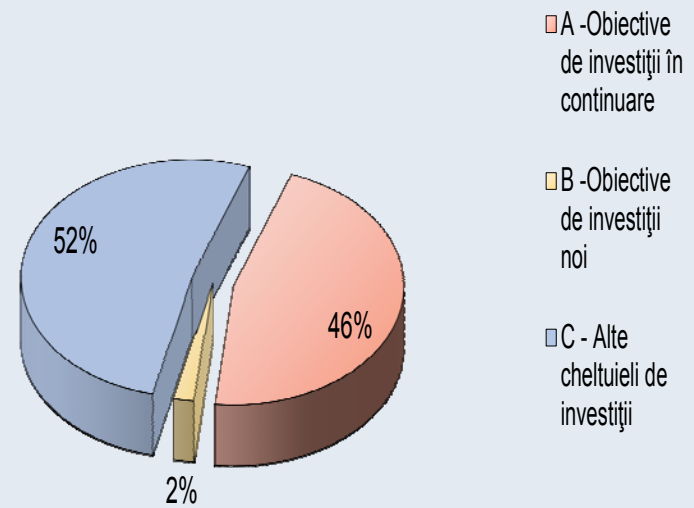


Prezentăm în cele ce urmează o analiză a situației proiectelor de investiții incluse în programul de investiții publice al celor 10 ministere incluse în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018.

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 12 obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, din care 7 în continuare (58,3% din numărul total de obiective) și 5 noi (41,7% din numărul total de obiective).

milioane lei

	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		1.042,0	1.032,0	737,0	736,0
A - Obiective de investiții în continuare	7	397,0	397,0	283,0	283,0
% din total	58,3	38,1	38,5	38,4	38,5
B - Obiective de investiții noi	5	224,0	224,0	130,0	130,0
% din total	41,7	21,5	21,7	17,6	17,7
TOTAL: A + B	12	621,0	621,0	413,0	413,0
% din total	100,0	59,6	60,2	56,0	56,1
C - Alte cheltuieli de investiții		421,0	411,0	324,0	323,0
% din total		40,4	39,8	44,0	43,9

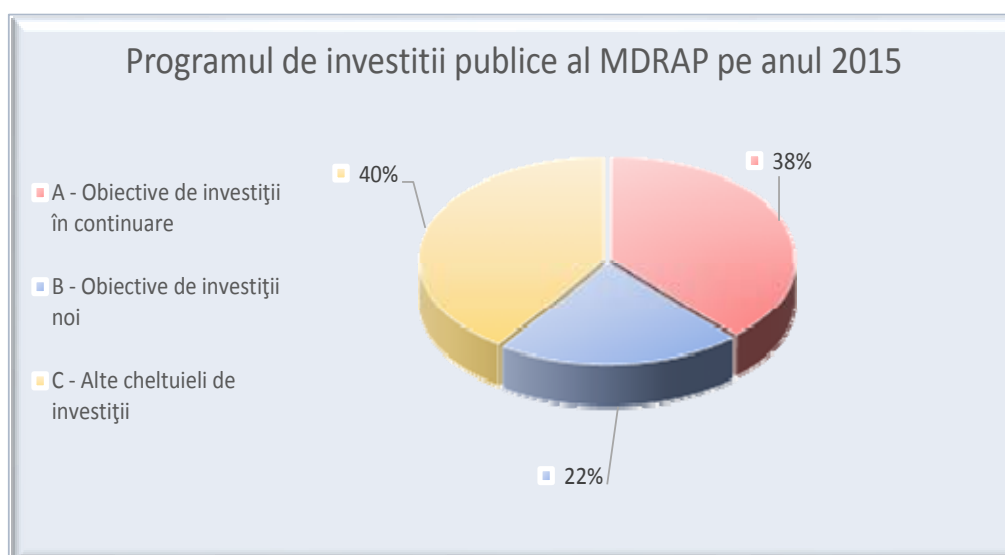

Pentru cele 12 obiective de investiții, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 621 milioane lei, integral de la bugetul de stat, repartizate astfel:

- ✓ pentru cele 7 obiective de investiții în continuare, s-a aprobat suma de 397 milioane lei. Plățile efectuate în anul 2015 au fost în sumă de 283 milioane lei (71,2 % din programul anual);
- ✓ pentru cele 5 obiective de investiții noi, s-a aprobat suma de 224 milioane lei. Plățile efectuate în anul 2015 au fost în sumă de 130 milioane lei (58 % din programul anual).

Analiza situației celor 12 obiective de investiții relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 13.666 milioane lei, integral de la bugetul de stat.


În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 12 obiective de investiții este de cca 22 ani.

2. Ministerul Finanțelor Publice

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 5 obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, toate în continuare.

milioane lei

	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		93,0	85,0	66,0	66,0
A - Obiective de investiții în continuare	5	5,0	5,0	5,0	5,0
% din total	100,0	5,4	5,9	7,6	7,6
B - Obiective de investiții noi	0	0,0	0,0	0,0	0,0
% din total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL: A + B	5	5,0	5,0	5,0	5,0
% din total	100,0	5,4	5,9	7,6	7,6
C - Alte cheltuieli de investiții		88,0	80,0	61,0	61,0
% din total		94,6	94,1	92,4	92,4

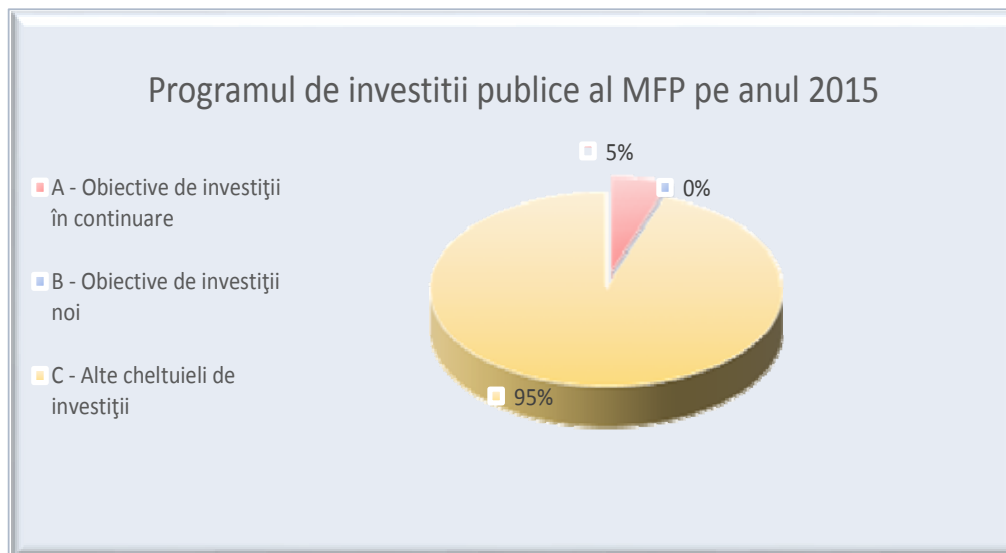

Pentru cele 5 obiective de investiții în continuare, pe anul 2015 au fost aprobate și plătite fonduri în sumă totală de 5 milioane lei, integral de la bugetul de stat.

Analiza situației celor 5 obiective de investiții în continuare relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 31 milioane lei, integral de la bugetul de stat.


În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 5 obiective de investiții în continuare este de cca 6 ani.

3. Ministerul Apărării Naționale

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 10 obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, din care 6 în continuare (60% din numărul total de obiective) și 4 noi (40% din numărul total de obiective).

milioane lei

	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		2.414,0	2.047,0	2.146,0	2.043,0
A - Obiective de investiții în continuare	6	49,0	44,0	44,0	42,0
% din total	60,0	2,0	2,1	2,1	2,1
B - Obiective de investiții noi	4	15,0	15,0	15,0	15,0
% din total	40,0	0,6	0,7	0,7	0,7
TOTAL: A + B	10	64,0	59,0	59,0	57,0
% din total	100,0	2,7	2,9	2,7	2,8
C - Alte cheltuieli de investiții		2.350,0	1.988,0	2.087,0	1.986,0
% din total		97,3	97,1	97,3	97,2

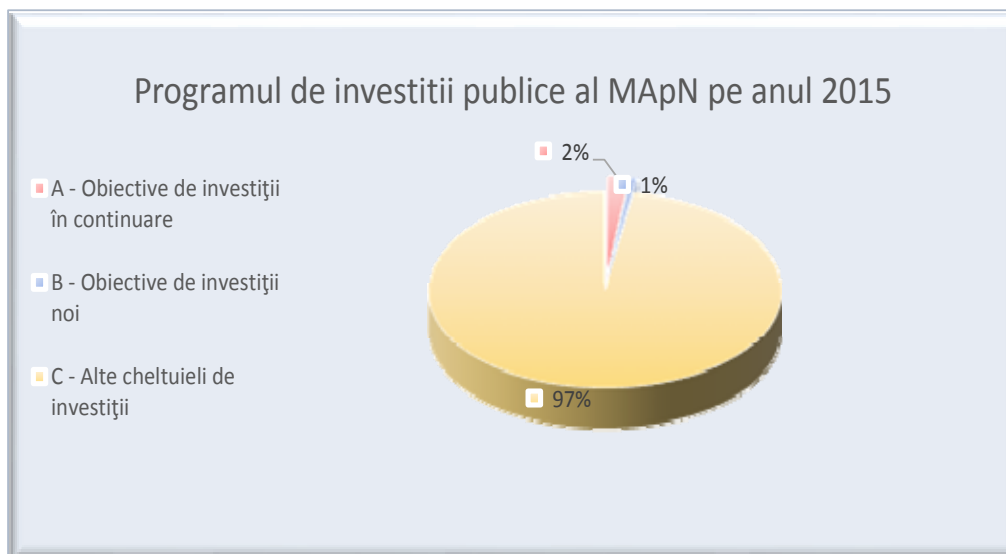

Pentru cele 10 obiective de investiții, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 64 milioane lei, din care 59 milioane lei de la bugetul de stat astfel:

- ✓ pentru cele 6 obiective de investiții în continuare:
 - ✓ pe total surse s-a aprobat suma de 49 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 44 milioane lei (89,8 % din programul anual).
 - ✓ pe buget de stat s-a aprobat suma de 44 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 42 milioane lei;
- ✓ pentru cele 4 obiective de investiții noi, s-a aprobat și plătit suma de 15 milioane lei, integral de la bugetul de stat.


Analiza situației celor 10 obiective de investiții relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 1.986 milioane lei, integral de la bugetul de stat.

În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 10 obiective de investiții este de cca 31 ani.

4. Ministerul Afacerilor Interne

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 14 obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, din care 13 în continuare (92,9% din numărul total de obiective) și unul nou (7,1% din numărul total de obiective).

milioane lei					
	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		760,0	442,0	598,0	359,0
A - Obiective de investiții în continuare	13	70,0	45,0	48,0	41,0
% din total	92,9	9,2	10,2	8,0	11,4
B - Obiective de investiții noi	1	10,0	3,0	3,0	2,0
% din total	7,1	1,3	0,7	0,5	0,6
TOTAL: A + B	14	80,0	48,0	51,0	43,0
% din total	100,0	10,5	10,9	8,5	12,0
C - Alte cheltuieli de investiții		680,0	394,0	547,0	316,0
% din total		89,5	89,1	91,5	88,0

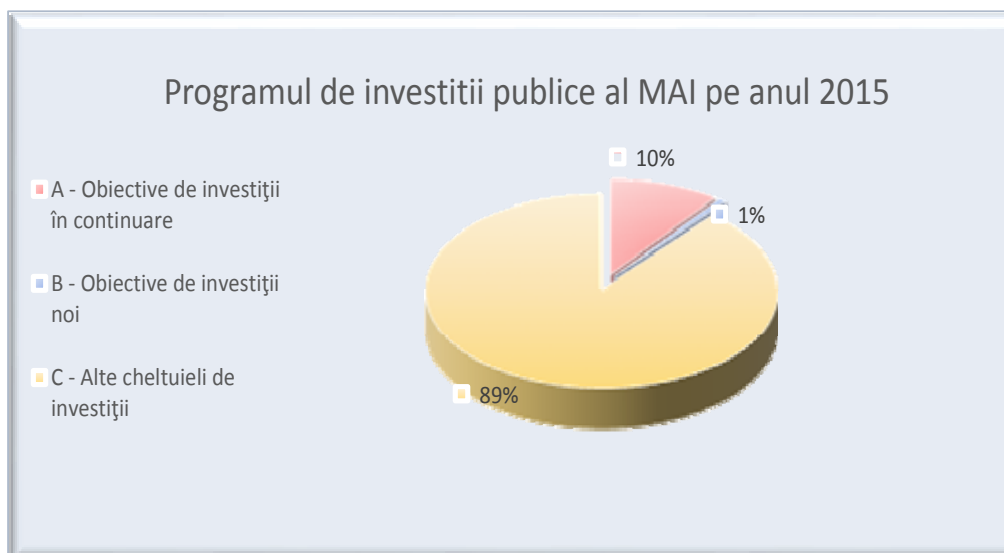

Pentru cele 14 obiective de investiții, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 80 milioane lei, din care 48 milioane lei de la bugetul de stat, astfel:

- ✓ pentru cele 13 obiective de investiții în continuare:
 - ✓ pe total surse s-a aprobat suma de 70 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 48 milioane lei (68,5 % din programul anual).
 - ✓ pe buget de stat s-a aprobat suma de 45 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 41 milioane lei;
- ✓ pentru obiectivul de investiții nou:
 - ✓ pe total surse s-a aprobat suma de 10 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 3 milioane lei (30 % din programul anual).
 - ✓ pe buget de stat s-a aprobat suma de 3 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 2 milioane lei (66,6 % din programul anual).

Analiza situației celor 14 obiective de investiții relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 482 milioane lei, din care suma de 465 milioane lei (96,4 %) de la bugetul de stat.


În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 14 obiective de investiții este de cca 6 ani.

5. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 5 obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, toate în continuare.

milioane lei

	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		34,0	34,0	16,0	16,0
A - Obiective de investiții în continuare	5	10,0	10,0	7,0	7,0
% din total	100,0	29,4	29,4	43,8	43,8
B - Obiective de investiții noi	0	0,0	0,0	0,0	0,0
% din total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL: A + B	5	10,0	10,0	7,0	7,0
% din total	100,0	29,4	29,4	43,8	43,8
C - Alte cheltuieli de investiții		24,0	24,0	9,0	9,0
% din total		70,6	70,6	56,3	56,3

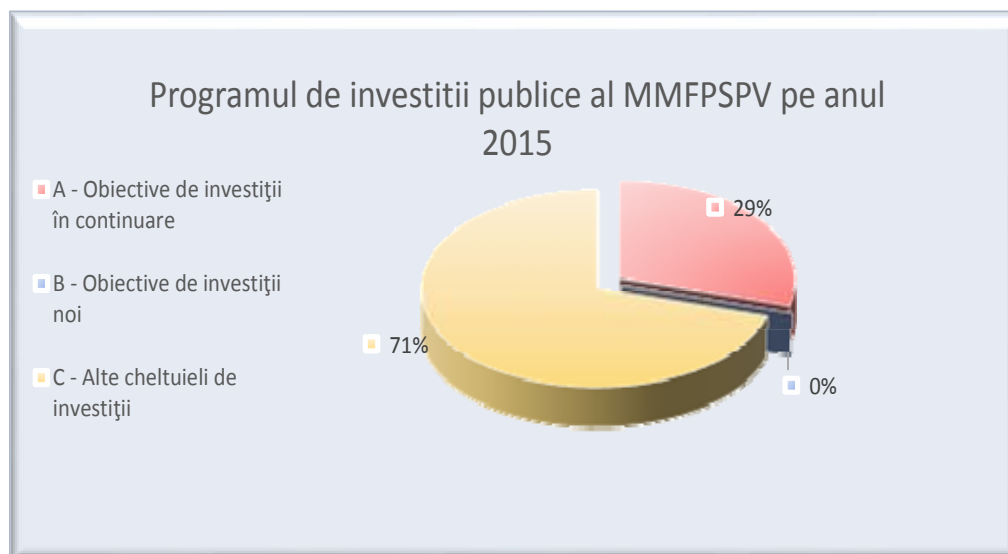

Pentru cele 5 obiective de investiții în continuare, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 10 milioane lei, integral de la bugetul de stat, iar plățile efectuate au fost în sumă de 7 milioane lei (70 % din programul anual).

Analiza situației celor 5 obiective de investiții în continuare relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 26 milioane lei, integral de la bugetul de stat.

În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 5 obiective de investiții în continuare este de cca 3 ani.

6. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale


În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 23 obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, din care 22 în continuare (95,7% din numărul total de obiective) și unul nou (4,3% din numărul total de obiective).

milioane lei

	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		143,9	124,9	104,0	104,0
A - Obiective de investiții în continuare	22	42,0	23,0	19,0	19,0
% din total	95,7	29,2	18,4	18,3	18,3
B - Obiective de investiții noi	1	0,9	0,9	0,0	0,0
% din total	4,3	0,6	0,7	0,0	0,0
TOTAL: A + B	23	42,9	23,9	19,0	19,0
% din total	100,0	29,8	19,1	18,3	18,3
C - Alte cheltuieli de investiții		101,0	101,0	85,0	85,0
% din total		70,2	80,9	81,7	81,7

Programul de investiții publice al MADR pe anul 2015

- A - Obiective de investiții în continuare
- B - Obiective de investiții noi
- C - Alte cheltuieli de investiții

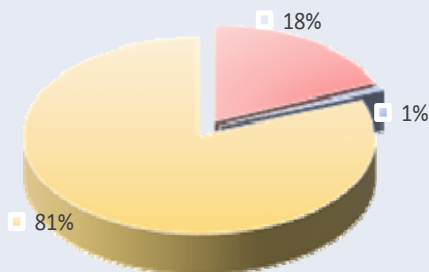

Pentru cele 23 obiective de investiții, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 42,9 milioane lei, din care 23,9 milioane lei de la bugetul de stat , astfel:

- ✓ pentru cele 22 obiective de investiții în continuare:
 - ✓ pe total surse s-a aprobat suma de 42 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 19 milioane lei (45,2 % din programul anual);
 - ✓ pe buget de stat s-a aprobat suma de 23 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 19 milioane lei (82,6 % din programul anual);
- ✓ pentru obiectivul de investiții nou, s-a aprobat suma de 0,9 milioane lei, integral de la bugetul de stat, iar în anul 2015 nu au fost efectuate plăți pentru acest obiectiv.

Analiza situației celor 23 obiective de investiții relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 146 milioane lei, din care suma de 89 milioane lei (60,9 %) de la bugetul de stat.


În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 23 obiective de investiții este de cca 3 ani.

7. Ministerul Transporturilor

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 122 de obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, din care 119 în continuare (97,5% din numărul total de obiective) și 3 noi (2,5% din numărul total de obiective).

milioane lei

	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		6.689,0	6.689,0	4.834,0	4.834,0
A - Obiective de investiții în continuare	119	5.759,0	5.759,0	4.111,0	4.111,0
% din total	97,5	86,1	86,1	85,0	85,0
B - Obiective de investiții noi	3	14,0	14,0	0,0	0,0
% din total	2,5	0,2	0,2	0,0	0,0
TOTAL: A + B	122	5.773,0	5.773,0	4.111,0	4.111,0
% din total	100,0	86,3	86,3	85,0	85,0
C - Alte cheltuieli de investiții		916,0	916,0	723,0	723,0
% din total		13,7	13,7	15,0	15,0

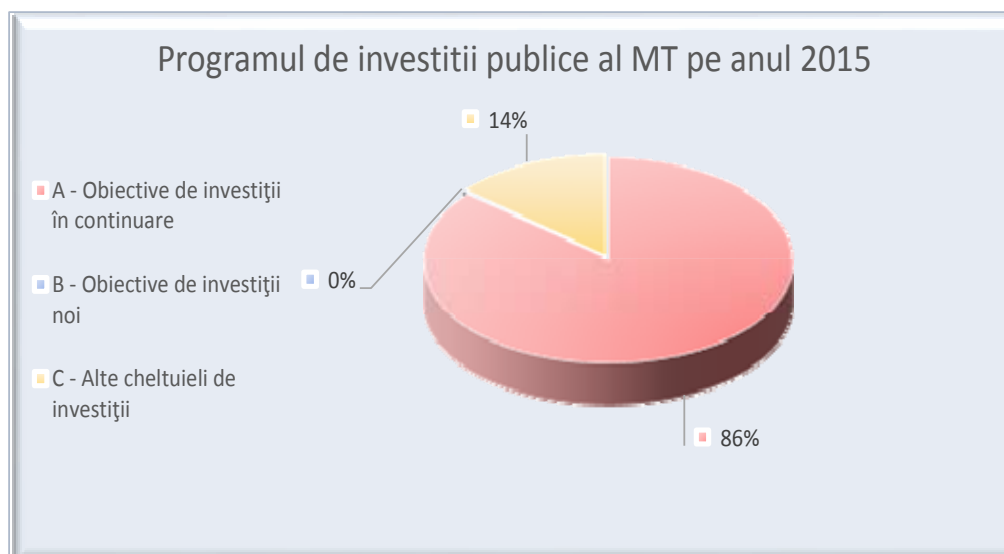

Pentru cele 122 obiective de investiții, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 5.773 milioane lei, integral de la bugetul de stat, astfel:

- ✓ pentru cele 119 obiective de investiții în continuare s-a aprobat suma de 5.759 milioane lei, integral de la bugetul de stat, din care au fost efectuate plăți în sumă de 4.111 milioane lei (71,4 % din programul anual);
- ✓ pentru cele 3 obiective de investiții noi, s-a aprobat suma de 14 milioane lei, integral de la bugetul de stat, iar în anul 2015 nu au fost efectuate plăți pentru acestea.

Analiza situației celor 122 obiective de investiții relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 50.695 milioane lei, din care suma de 50.176 milioane lei (98,9%) de la bugetul de stat.


În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 122 obiective de investiții este de cca 6 ani.

8. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 81 de obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, din care 76 în continuare (93,8% din numărul total de obiective) și 5 noi (6,2% din numărul total de obiective).

milioane lei

	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		2.099,0	818,0	1.536,0	625,0
A - Obiective de investiții în continuare	76	649,0	576,0	465,0	445,0
% din total	93,8	30,9	70,4	30,3	71,2
B - Obiective de investiții noi	5	132,0	9,0	97,0	7,0
% din total	6,2	6,3	1,1	6,3	1,1
TOTAL: A + B	81	781,0	585,0	562,0	452,0
% din total	100,0	37,2	71,5	36,6	72,3
C - Alte cheltuieli de investiții		1.318,0	233,0	974,0	173,0
% din total		62,8	28,5	63,4	27,7

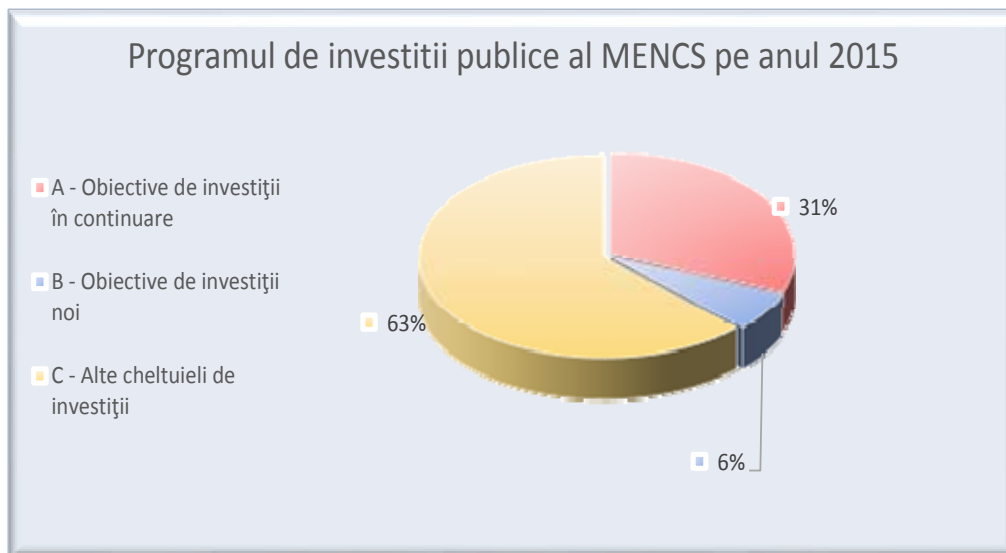

Pentru cele 81 obiective de investiții, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 781 milioane lei, din care 585 milioane lei de la bugetul de stat, astfel:

- ✓ pentru cele 76 obiective de investiții în continuare:
 - ✓ pe total surse s-a aprobat suma de 649 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 465 milioane lei (71,6 % din programul anual).
 - ✓ pe buget de stat s-a aprobat suma de 576 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 445 milioane lei (77,2 % din programul anual);
- ✓ pentru cele 5 obiective de investiții noi:
 - ✓ pe total surse s-a aprobat suma de 132 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 97 milioane lei (73,4 % din programul anual).
 - ✓ pe buget de stat s-a aprobat suma de 9 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 7 milioane lei (77,8 % din programul anual).

Analiza situației celor 81 obiective de investiții relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 538 milioane lei, din care suma de 442 milioane lei (82%) de la bugetul de stat.


În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 81 obiective de investiții este de cca 1 an.

9. Ministerul Sănătății

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, au fost incluse un număr de 3 obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct în programul de investiții publice, din care 1 în continuare (33,3% din numărul total de obiective) și 2 noi (66,7% din numărul total de obiective).

milioane lei

	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		655,0	254,0	478,3	238,0
A - Obiective de investiții în continuare	1	10,0	10,0	10,0	10,0
% din total	33,3	1,5	3,9	2,1	4,2
B - Obiective de investiții noi	2	8,0	0,0	0,3	0,0
% din total	66,7	1,2	0,0	0,1	0,0
TOTAL: A + B	3	18,0	10,0	10,3	10,0
% din total	100,0	2,7	3,9	2,2	4,2
C - Alte cheltuieli de investiții		637,0	244,0	468,0	228,0
% din total		97,3	96,1	97,8	95,8

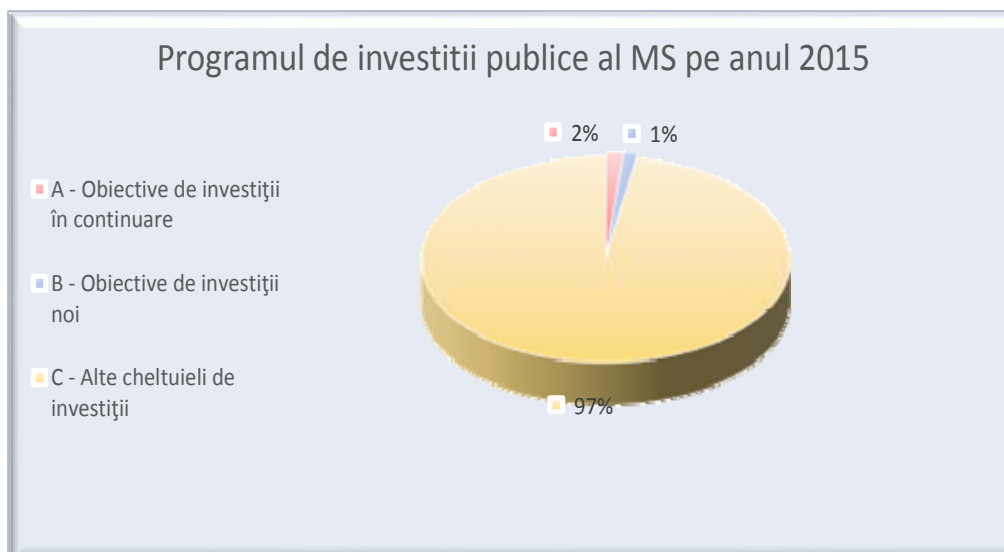

Pentru cele 3 obiective de investiții, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 18 milioane lei, din care 10 milioane lei de la bugetul de stat, astfel:

- ✓ pentru obiectivul de investiții în continuare, s-a aprobat și plătit suma de 10 milioane lei, integral de la bugetul de stat;
- ✓ pentru cele 2 obiective de investiții noi, s-a aprobat suma de 8 milioane lei, integral din venituri proprii. Plățile efectuate în anul 2015 au fost în sumă de 0,3 milioane lei (3,75 % din programul anual).


Analiza situației celor 3 obiective de investiții relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 163 milioane lei, din care suma de 4 milioane lei (2,45%) de la bugetul de stat.

În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a celor 3 obiective de investiții este de cca 9 ani.

10. Ministerul Fondurilor Europene

În programul de investiții publice aprobat acestui minister pe anul 2015, nu au fost incluse obiective / proiecte / programe de investiții identificate distinct.

milioane lei					
	Număr obiective	2015			
		Program		Plăți 31.12.2015	
		Total	din care: Buget de Stat	Total	din care: Buget de Stat
Total, din care:		13,0	13,0	12,0	12,0
A - Obiective de investiții în continuare	0	0,0	0,0	0,0	0,0
% din total		0,0	0,0	0,0	0,0
B - Obiective de investiții noi	0	0,0	0,0	0,0	0,0
% din total		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL: A + B	0	0,0	0,0	0,0	0,0
% din total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C - Alte cheltuieli de investiții		13,0	13,0	12,0	12,0
% din total		100,0	100,0	100,0	100,0

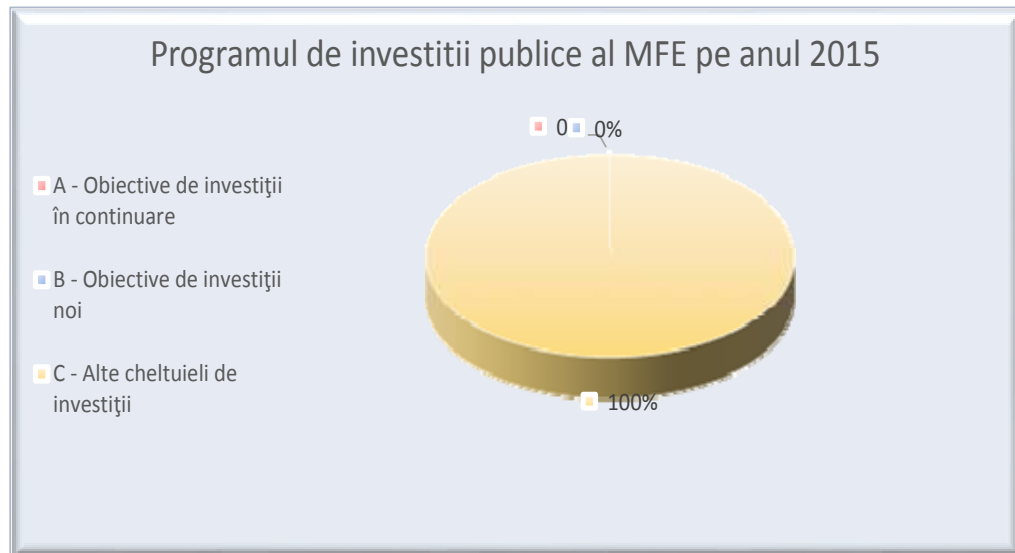

Pentru categoriile de investiții cuprinse la poziția C „Alte cheltuieli de investiții”, pe anul 2015 au fost aprobate fonduri în sumă totală de 13 milioane lei, din care au fost efectuate plăți în sumă de 12 milioane lei, integral de la bugetul de stat.

Analiza situației categoriilor de investiții relevă faptul că, pentru finalizarea acestora, instituția estimează a fi necesară o sumă totală de 1 milion lei, integral de la bugetul de stat.

În condițiile menținerii ritmului de finanțare existent în anul 2015, durata estimată de finalizare a categoriilor de investiții este de cca 1 an.

*
* *

În baza analizei mai sus prezentate, deși se remarcă o îmbunătățire în modul de stabilire a priorităților în finanțarea proiectelor, în cazul anumitor ministere, modul de alocare a fondurilor pe proiectele / categoriile de investiții incluse în programul de investiții publice prezintă încă disfuncționalități, ceea ce denotă că este necesară continuarea procesului de perfecționare a prioritizării proiectelor.

În anexă, prezentăm „*Lista proiectelor / categoriilor de investiții incluse în programul de investiții publice aprobat pe anul în curs ca anexă (Anexele 28 și 29) la*

bugetele ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de Stat”, ordonate descrescător în funcție de program.
